

# RDC/Contratação Integrada

## Análise de Contratações de Transporte Rodoviário

maio/2019

**sinaenco**  
SINDICATO DA ARQUITETURA E DA ENGENHARIA

## RDC/CONTRATAÇÃO INTEGRADA – ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Este levantamento tem por objetivo avaliar a eficácia do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC)/Contratação Integrada na redução/eliminação de aditamentos contratuais de prazo e/ou valor.

A Contratação Integrada é um dos regimes de execução indireta de obras e serviços de engenharia previsto na Lei 12.462/2011, que estabeleceu o RDC. O Regime Diferenciado foi criado inicialmente para uso exclusivo nas licitações dos empreendimentos da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Posteriormente, foi ampliado para os empreendimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do SUS, de estabelecimento de ensino, de presídios e unidades socioeducativas.

Na Contratação Integrada, o vencedor do processo licitatório elabora os projetos de engenharia e arquitetura, fornece os materiais e equipamento, executa obras, serviços e montagens, realizar testes, a pré-operação e todas as demais atividades necessárias e suficientes para a entrega final do projeto.

Nessa modalidade de contratação o licitante elabora sua proposta com base em um anteprojeto e, se contratado e cumprir com suas obrigações, é remunerado por um preço global, ou seja, recebe o valor estipulado no contrato, independentemente das quantidades de serviços executados ou de insumos utilizados.

O Sinaenco tem acompanhando licitações de empreendimentos pelo RDC/Contratação Integrada desde 2011, tendo realizado estudos sobre certames da Infraero, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e relativos a obras de mobilidade urbana nas cidades-sede da Copa de 2014.

Neste momento, uma nova análise sobre a modalidade se faz necessária, uma vez que o Projeto de Lei 1.295/95, que altera a Lei de Licitações e Contratos, em tramitação na Câmara dos Deputados, contempla a possibilidade da adoção da Contratação Integrada em licitações para obras, serviços e fornecimentos, com valores acima de R\$ 10 milhões.

### ESCOPO

O estudo avaliou 146 contratos celebrados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio do Regime de Contratação Integrada, decorrentes de 55 processos licitatórios deflagrados entre setembro de 2012 e setembro de 2014 (quatro processos foram desconsiderados por terem sido revogados).

Os instrumentos contratuais foram classificados da seguinte forma: *em execução*, *encerrados*, *rescindidos* e *suspensos*. Foram considerados *encerrados* contratos com prazo de vigência vencido e para os quais não há informação disponível sobre a suspensão ou aditivo contratual de prazo até 29 de maio de 2019.

As publicações do Diário Oficial da União (DOU) constituíram a base da pesquisa sobre *status* de cada contrato. Outras fontes de consulta foram o API de Compras Governamentais, que disponibiliza dados do Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais (SIASG) do Governo Federal, e Relatórios de Gestão do DNIT. Também foram solicitados dados diretamente ao órgão, por meio da Lei de Acesso à Informação.

O Anexo I traz tabela com todos os 146 contratos analisados, com informações sobre número do contrato, objeto, existência ou não de aditamentos contratuais de prazo e/ou de valor, situação e fontes de informação.

## RESULTADOS

Até o final de maio de 2019, 24% (35) dos contratos – que foram assinados entre fevereiro de 2013 e novembro de 2014 – estavam *encerrados*, 63% (92) *em execução*, 6,8% (10) *suspensos* e 6,2% (9) *rescindidos*.

**Situação dos 146 Contratos Analisados**




Elaborado por SINAENCO.


**Fonte:** Diário Oficial da União (DOU), API de Compras Governamentais, Relatórios de Gestão do DNIT e Lei de Acesso à Informação.

Dos 35 contratos *encerrados*, correspondente a 24% da amostra, 60% (21) apresentaram aditamento contratual de prazo e 57,1% (20) de valor. Somente 22,9% (8) dos instrumentos não evidenciaram aditamentos de prazo e/ou valor. A análise do total de contratos mostra situação ainda pior: apenas 5,5% dos 146 contratos analisados foram encerrados sem a celebração de aditamentos de prazo e/ou valor.


**Contratos Encerrados - Aditivos de Prazo**

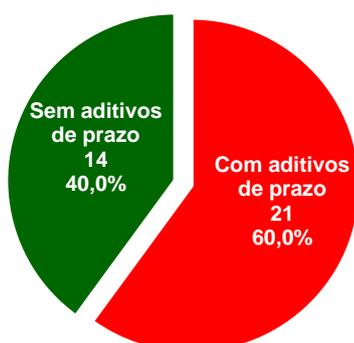

**Contratos Encerrados - Aditamento de Valor**

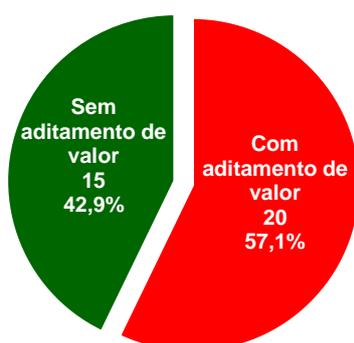

**Contratos Encerrados - Aditamentos - Prazo e/ou Valor**

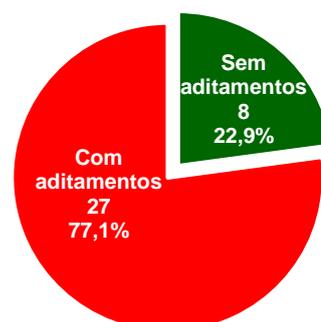


Elaborado por SINAENCO.

Fonte: Diário Oficial da União (DOU), API de Compras Governamentais, Relatórios de Gestão do DNIT e Lei de Acesso à Informação.

Dentre os 92 contratos *em execução*, 77,2% (71) evidenciaram aditamento contratual de prazo e 67,4% (62) de valor. Somente 9,8% (9) dos 92 instrumentos *em execução* não tinham aditamentos de prazo e/ou valor firmados até maio de 2019. Vale ressaltar que esses contratos ainda podem sofrer alterações de valor e prorrogações de prazo futuramente.

**Contratos em Execução - Aditivos de Prazo**

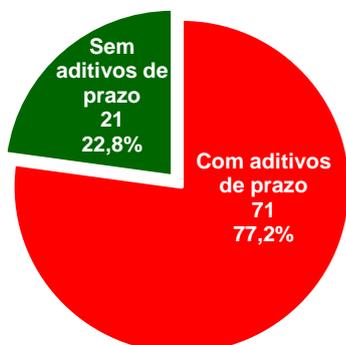

**Contratos em Execução - Aditamentos de Valor**



**Contratos em Execução - Aditivos**




Elaborado por SINAENCO.

Fonte: Diário Oficial da União (DOU), API de Compras Governamentais, Relatórios de Gestão do DNIT e Lei de Acesso à Informação.

Na análise conjunta dos contratos em situação *encerrada* (35) e em *execução* (92), constatou-se que 72,4% (92) detinham aditamento contratual de prazo e 64,6% (82) de valor. Somente 13,4% (17) dos 127 contratos não sofreram repactuação do valor contratual e/ou prorrogação do prazo de vigência.

**Contratos Encerrados e em Execução - Aditivos de Prazo**

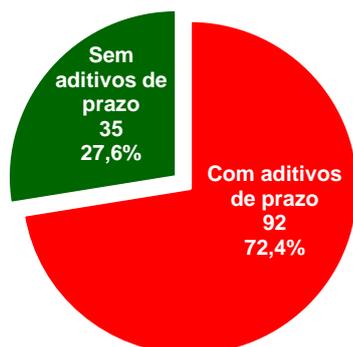

**Contratos Encerrados e em Execução - Aditamentos de Valor**



**Contratos Encerrados e em Execução - Aditivos**



Elaborado por SINAENCO.

Fonte: Diário Oficial da União (DOU), API de Compras Governamentais, Relatórios de Gestão do DNIT e Lei de Acesso à Informação.

Esses resultados atestam a ineficácia do Regime de Contratação Integrada em seus próprios objetivos, que são a redução/eliminação dos aditamentos contratuais de prazo e/ou valor e celeridade na entrega das obras contratadas.

Os desdobramentos negativos do Regime de Contratação Integrada começam pela precária definição e especificação do objeto da contratação. O anteprojeto indicado no certame é um documento técnico extremamente carente de informações indispensáveis para possibilitar a adequada especificação de um empreendimento e, conseqüentemente, ineficaz para o controle da qualidade do produto que será produzido, do seu prazo de execução, bem como dos custos envolvidos na implantação, operação e manutenção do bem em questão.

## ANEXO I

Nº do contrato	Objeto	Data de assinatura	Adit. de prazo	Adit. de valor	Situação	Fonte de informação
35/2013	Serviço técnico especializado de engenharia para elaboração de projeto básico e executivo e execução das obras de implantação e pavimentação da rodovia BR-163/PA; trecho: Div. MT/PA - Fronteira Brasil/Suriname; subtrecho: entr. BR-230 (A) (Fim do trecho pavimentado - Campo Verde) - entr. 230 (B) Rurópolis; segmento: 676,31 km - 788,98 km; extensão: 112,67 km.	07/03/13	X		Suspensão	(1) (2) (4)
369/2013	Prestação de serviços de elaboração de projeto básico e de projeto executivo de engenharia e execução das obras de restauração da pista existente, de adequação de capacidade, melhoria da segurança, com eliminação de pontos críticos, construção de contornos rodoviários, duplicação, implantação de sistema de iluminação pública e construção de obras-de-arte especiais na rodovia BR-163/364/MT - Lote único.	21/05/13	X	X	Em execução	(1) (2) (4)
493/2013	Elaboração do projeto básico e executivo, execução das obras de duplicação, restauração da pista existente, implantação de ruas laterais e restauração/construção de obras de arte-especiais na BR-158/RS e BR-287/RS (Travessia Urbana de Santa Maria) - Lote 01.	31/07/2013	X		Em execução	(1) (2)
494/2013	Elaboração do projeto básico e executivo, execução das obras de duplicação, restauração da pista existente, implantação de ruas laterais e restauração/construção de obras de arte-especiais na BR-158/RS e BR-287/RS (Travessia Urbana de Santa Maria) - Lote 02.	24/06/13	X		Em execução	(1) (2)
399/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 01, nas BR's -040/120/262/356/381/482 no Estado de Minas Gerais.	13/05/13	X	X	Encerrado	(1) (2)
400/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária no âmbito do PNS e sinalização rodoviária - BR-Legal, Lote 02, nas rodovias federais BR-040/135/259/262/494/MG.	13/05/2013		X	Encerrado	(1) (2)
401/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária no âmbito do PNS e sinalização rodoviária - BR-Legal, Lote 03, nas rodovias federais BR's-050/146/262 no Estado de Minas Gerais.	13/05/2013	X	X	Encerrado	(1) (2)
402/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária no âmbito do PNS e sinalização rodoviária - BR-Legal, Lote 04, nas rodovias federais BR-050, BR-365, BR-452 do Estado de Minas Gerais.	13/05/2013	X	X	Encerrado	(1) (2)
403/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 05, nas rodovias federais BR-153/364/365/MG.	13/05/2013	X	X	Encerrado	(1) (2)
404/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 06, nas rodovias federais BR-101/354/356/393/465/485/493/495/RJ.	13/05/2013	X	X	Encerrado	(1) (2)
471/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 07, nas rodovias federais BR-060/BR-158/BR-364 no Estado de Goiás.	06/09/2013			Encerrado	(1) (2)

Nº do contrato	Objeto	Data de assinatura	Adit. de prazo	Adit. de valor	Situação	Fonte de informação
472/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 08, nas rodovias federais BR-070/BR-158, no estado de Goiás.	06/09/2013			Encerrado	(1) (2)
473/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 09, nas rodovias federais BR-020, 060, 070, 080 e 251/DF.	17/05/2013	X	X	Encerrado	(1) (2)
474/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, nas rodovias BR-070/163/174 no Estado do Mato Grosso - Lote 10.	21/05/2013	X	X	Em execução	(1) (2)
475/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, nas rodovias federais BR-070/163/364 no Estado do Mato Grosso - Lote 11.	07/06/2013	X	X	Em execução	(1) (2)
476/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, nas rodovias federais BR-174/364 no Estado do Mato Grosso - Lote 12.	17/05/2013	X	X	Encerrado	(1) (2)
477/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, nas rodovias federais BR-163/364 no Estado do Mato Grosso - Lote 13.	17/05/2013	X	X	Encerrado	(1) (2)
507/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, nas rodovias federais BR-116/122/222/402/403 no estado do Ceará - Lote 14.	07/06/2013		X	Encerrado	(1) (2)
508/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, nas rodovias federais BR-020/226 e 404 no estado do Ceará - Lote 15.	07/06/2013	X	X	Encerrado	(1) (2)
509/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, Lote 16, na rodovia federal BR-101, no Estado de Pernambuco.	07/06/2013	X		Encerrado	(1) (2)
510/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, nas rodovias federais BR-104/408, no estado de Pernambuco - Lote 17.	21/05/2013	X	X	Encerrado	(1) (2)
511/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, na rodovia federal BR-232, no estado do Pernambuco - Lote 18.	21/06/2013	X	X	Em execução	(1) (2)

Nº do contrato	Objeto	Data de assinatura	Adit. de prazo	Adit. de valor	Situação	Fonte de informação
549/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, Lote 19, na rodovia federal BR-317/BR-364, no estado do Acre.	06/09/2013	X	X	Em execução	(1) (2)
550/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, Lote 20, na BR-364 no Estado do Acre.	06/09/2013	X	X	Em execução	(1) (2)
551/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, nas rodovias federais BR-174/364 e 435 do estado de Rondônia - Lote 21.	19/06/2013	X	X	Em execução	(1) (2)
552/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR Legal, nas rodovias federais BR-364/429 e 421 do Estado de Rondônia - Lote 22.	21/06/2013	X	X	Em execução	(1) (2)
553/2013	Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia e execução dos Serviços Técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, nas rodovias federais BR-319/364 e 425 no estado de Rondônia - Lote 23.	17/07/2013	X	X	Encerrado	(1) (2)
840/2013	Seleção de empresa para elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras de implantação da BR-285/SC, incluindo o contorno a Timbé do Sul, no segmento do km 33,8 ao km 55,8, lote único.	25/10/13	X		Em execução	(1) (2)
316/2013	Elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras complementares à Ponte do Rio Madeira, incluindo Conjunto Habitacional Popular e Dolphin's Adicionais, na rodovia BR-319/RO.	06/08/13		X	Encerrado	(1) (2) (3)
261/2013	Contratação de empresa para elaboração de Projeto Executivo e Execução das Obras de Implantação das Instalações de Fronteira - Aduana, Brasil e a Guiana Francesa, na BR-156/AP.	03/05/13	X	X	Encerrado	(1) (2) (3)
929/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal - Lote 24.	11/12/13	X	X	Em execução	(1) (2)
930/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal - nas rodovias federais BR-116/259/381/458/474 do Estado de Minas Gerais, Lote 25.	11/12/13	X	X	Em execução	(1) (2)
931/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, na rodovia federal BR-116/BR-367 no Estado de Minas Gerais, Lote 26.	27/02/14	X	X	Em execução	(1) (2)
932/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal - na rodovia federal BR-251 do Estado de Minas Gerais, Lote 27.	26/11/13	X	X	Em execução	(1) (2)
933/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal - nas Rodovias Federais BR-135/251/365/367 do Estado de Minas Gerais, Lote 28.	27/11/13	X	X	Em execução	(1) (2)

Nº do contrato	Objeto	Data de assinatura	Adit. de prazo	Adit. de valor	Situação	Fonte de informação
934/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal - nas rodovias BR-265/354/369/494 do Estado de Minas Gerais, Lote 29.	27/11/13	X	X	Em execução	(1) (2)
935/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal - nas rodovias federais BR-146/267/383/459/491 do Estado de Minas Gerais, Lote 30.	27/11/13	X	X	Em execução	(1) (2)
936/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal - nas rodovias federais BRs-040/265/267/354/460/499 no estado de Minas Gerais - Lote 31.	27/11/13	X	X	Em execução	(1) (2)
937/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, nas rodovias federais BR's-352/354/365 do Estado de Minas Gerais - Lote 32.	27/11/13	X	X	Em execução	(1) (2)
938/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, nas Rodovias Federais BR's -101/259/262/342/381/393/447/482/484 do estado do Espírito Santo - Lote 34.	18/11/13	X	X	Encerrado	(1) (2)
1039/2013	Projeto básico e executivo de engenharia e execução de serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 35, na rodovia federal BR-060/BR-070/BR-153/BR-414 no Estado de Goiás.	15/01/14	X	X	Em execução	(1) (2)
1041/2013	Projeto básico e executivo de engenharia e execução de serviços técnicos de aplicação e manutenção e dispositivos de segurança e sinalização rodoviária, no âmbito do programa nacional de segurança e sinalização rodoviária - BR-Legal, Lote 38, na rodovia BR-060/153, no Estado de Goiás.	21/03/14			Rescindido	(1) (2)
1042/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, nas rodovias federais BR's-060/452 no Estado de Goiás - Lote 39.	17/01/14			Rescindido	(1) (2)
1043/2013	Projeto básico e executivo de engenharia e execução de serviços técnicos de aplicação e manutenção e dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do programa nacional de segurança e sinalização rodoviária - BR-Legal, Lote 40, nas rodovias federais BR-08/153/251/414 do Estado de Goiás.	04/02/14	X	X	Em execução	(1) (2)
1044/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 41, nas Rodovias Federais BR-020, BR-040 e BR-251 no Estado de Goiás.	20/06/14		X	Em execução	(1) (2)
1045/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 42, na rodovia federal BR-070/BR-158 no Estado de Mato Grosso.	15/01/14	X	X	Em execução	(1) (2)

Nº do contrato	Objeto	Data de assinatura	Adit. de prazo	Adit. de valor	Situação	Fonte de informação
1046/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 44, na rodovia federal BR-060/BR-163/BR-359 no Estado do Mato Grosso do Sul.	07/03/14	X	X	Em execução	(1) (2)
1047/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 45, na rodovia federal BR-060/163/262, no Estado do Mato Grosso do Sul.	14/03/14	X	X	Em execução	(1) (2)
1048/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 46, nas rodovias BR-163/267/376/463/487, no Estado do Mato Grosso do Sul.	19/02/14	X	X	Em execução	(1) (2)
1049/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 47, nas rodovias BR-158/262/436/497/267, no Estado do Mato Grosso do Sul.	28/03/14		X	Em execução	(1) (2)
1050/2013	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução de serviços técnicos de aplicação e manutenção e dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do programa nacional de segurança e sinalização rodoviária - BR-Legal, Lote 48, nas rodovias federais BR-060/BR-262/BR-267/BR-359/BR-419 no Estado do Mato Grosso do Sul.	19/02/14			Em execução	(1) (2)
1/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 54, nas rodovias federais BR-135/122/402, no Estado do Maranhão.	06/02/14	X	X	Em execução	(1) (2)
2/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 55, nas rodovias federais BR-222/BR-316 no Estado do Maranhão.	06/02/14	X	X	Em execução	(1) (2)
3/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 56, nas rodovias federais BR-135/226/316 no Estado do Maranhão.	14/03/14	X	X	Em execução	(1) (2)
4/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 56, Lote 57, na rodovia BR-230, no Estado do Maranhão.	11/02/14	X	X	Em execução	(1) (2)
5/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 58, na rodovia federal BR-010/BR-226 no Estado do Maranhão.	06/02/14	X	X	Em execução	(1) (2)
6/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 59, nas rodovias federais BR-222/BR-343/BR-402/BR-404 no Estado do Piauí.	17/02/14			Encerrado	(1) (2)

Nº do contrato	Objeto	Data de assinatura	Adit. de prazo	Adit. de valor	Situação	Fonte de informação
7/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 60, nas rodovias federais BR-020/407, no Estado do Piauí.	06/02/14	X	X	Em execução	(1) (2)
8/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 61, nas rodovias federais BR-316/BR-230 no Estado do Piauí.	14/02/14	X	X	Em execução	(1) (2)
9/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 62, na rodovia federal BR-135/ BR-235/BR-343 no Estado do Piauí.	18/02/14	X	X	Em execução	(1) (2)
31/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 63 na rodovia BR-158/285, no Estado do Rio Grande do Sul.	05/03/14	X	X	Em execução	(1) (2)
32/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 64, na rodovia BR-158/386/392/468/472, no Estado do Rio Grande do Sul.	07/03/14	X	X	Em execução	(1) (2)
33/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e Manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 65, nas rodovias BR-101/116/285, no Estado do Rio Grande do Sul.	17/02/14	X	X	Em execução	(1) (2)
34/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária -BR-Legal, Lote 66, na rodovia federal BR-010/BR-153/BR-242 no Estado do Tocantins.	14/03/14	X	X	Em execução	(1) (2)
35/2014	Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução dos Serviços Técnicos de Aplicação e Manutenção de dispositivos de segurança e de Sinalização Rodoviária, no Âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária -BR-Legal - Lote 67, nas rodovias federais BR-010/BR-153/BR-235 no Estado do Tocantins.	14/02/14	X	X	Em execução	(1) (2)
36/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 68, nas rodovias federais BR-010/153/226/230, no Estado de Tocantins.	12/03/14	X	X	Em execução	(1) (2)
132/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 69, na BR-153/277/376/466/476, no Estado do Paraná.	06/03/14			Encerrado	(1) (2)
133/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 70, nas rodovias federais BR-158/BR-272/BR-369/BR-373/BR-487 no Estado do Paraná.	12/03/14		X	Encerrado	(1) (2)

Nº do contrato	Objeto	Data de assinatura	Adit. de prazo	Adit. de valor	Situação	Fonte de informação
134/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 71, na BR-163/272/277/280/467/469, no Estado do Paraná.	24/06/14		X	Em execução	(1) (2)
135/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 72, nas rodovias federais BR-110/BR-116/BR-230/BR-361 no Estado da Paraíba.	20/02/14		X	Encerrado	(1) (2)
136/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 73, nas rodovias federais BR-230/101, no Estado da Paraíba.	21/02/14		X	Encerrado	(1) (2)
137/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 74, nas rodovias federais BR-104/BR-110/BR-230/BR-4012 no Estado da Paraíba.	20/02/13			Em execução	(1) (2)
299/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 75, na BR-101/158/459/488, no Estado de São Paulo.	07/05/14			Suspensão	(1) (2)
300/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 76, nas rodovias federais BR-282/153/158/163 no Estado de Santa Catarina.	07/05/14	X	X	Em execução	(1) (2)
301/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 77, nas Rodovias Federais BR-280 e BR-470 no Estado de Santa Catarina.	29/04/14		X	Em execução	(1) (2)
302/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 78, nas Rodovias Federais BR-101/282 - no Estado de Santa Catarina.	06/06/14		X	Em execução	(1) (2)
303/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 79, nas Rodovias Federais BR-101, BR-104, BR-316, BR-416, BR-424 no Estado de Alagoas.	22/05/14	X	X	Em execução	(1) (2)
304/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 80, na Rodovia Federal BR-101/BR-316/BR-423 no Estado de Alagoas.	26/05/14			Encerrado	(1) (2)
492/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 81, na Rodovia Federal BR-110/BR-226/BR-304/BR-405 do Estado do Rio Grande do Norte.	17/07/14			Em execução	(1) (2)

Nº do contrato	Objeto	Data de assinatura	Adit. de prazo	Adit. de valor	Situação	Fonte de informação
493/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 82, na rodovia federal BR-226/427 no Estado do Rio Grande do Norte.	04/07/14			Em execução	(1) (2)
494/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 83, na BR-101/226/304/406, no Estado do Rio Grande do Norte.	14/07/14		X	Em execução	(1) (2)
495/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 84, na rodovia BR-153/470, no Estado do Rio Grande do Sul.	04/07/14		X	Em execução	(1) (2)
496/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 85, na rodovia BR-101/293/471/RS, no Estado do Rio Grande do Sul.	17/07/14		X	Em execução	(1) (2)
497/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 86, na Rodovia Federal BR-153/BR-158/BR-293/BR-473 no Estado do Piauí.	17/07/14			Em execução	(1) (2)
498/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, nas rodovias federais BR-287/392 do Estado do Rio Grande do Sul, Lote 87.	23/07/14			Em execução	(1) (2)
499/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 88, na BR-290/472/RS, no Estado do Rio Grande do Sul.	17/07/14			Em execução	(1) (2)
500/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 89, na BR-285/386/377/480, no Estado do Rio Grande do Sul.	24/11/14		X	Em execução	(1) (2)
501/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 90, na rodovia federal BR-116/BR-153/BR-290/BR-471 no Estado do Rio Grande do Norte.	21/07/14			Em execução	(1) (2)
502/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 92, na Rodovia BR-020/135/242, no Estado da Bahia.	18/08/14		X	Em execução	(1) (2)
503/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 93, na Rodovia Federal BR-101/BR-110/BR-420 no Estado da Bahia.	17/07/14			Em execução	(1) (2)

Nº do contrato	Objeto	Data de assinatura	Adit. de prazo	Adit. de valor	Situação	Fonte de informação
504/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 94 nas rodovias BR-110/116/235/410, no Estado da Bahia.	13/10/14		X	Em execução	(1) (2)
505/2014	Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e de Sinalização Rodoviária BR-Legal, Lote 95, nas Rodovias Federais BR-101/BR-367/BR-418/BR-498 no Estado da Bahia.	08/08/14		X	Em execução	(1) (2)
139/2014	Elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras prioritárias de melhoria de capacidade, incluindo duplicação na rodovia BR-290/RS - lote 01.	06/03/14	X		Em execução	(1) (2)
1070/2013	Contratação Integrada de empresa para elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras prioritárias de melhoria de capacidade incluindo duplicação, na rodovia BR-290/ RS - Lote 02.	16/01/14	X		Suspensão	(1) (2)
1126/2013	Contratação Integrada de empresa para elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras prioritárias de melhoria de capacidade incluindo duplicação, na rodovia BR-290/ RS - Lote 04.	10/02/14	X		Em execução	(1) (2)
1082/2013	Projeto básico e executivo de engenharia e execução de serviços técnicos de aplicação e manutenção e dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária, BR-Legal, Lote 49, na rodovia federal BR-116/BR-230/BR-304 do Estado do Ceará.	04/02/14	X	X	Em execução	(1) (2)
1083/2013	Projeto básico e executivo de engenharia e execução de serviços técnicos de aplicação e manutenção e dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária, BR-Legal, Lote 50, nas rodovias federais BR-232/116/316, no Estado de Pernambuco.	17/03/14	X	X	Em execução	(1) (2)
1084/2013	Projeto básico e executivo de engenharia e execução de serviços técnicos de aplicação e manutenção e dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 51, nas rodovias federais BR-110/BR-423/BR-424 no Estado de Pernambuco.	04/02/14	X	X	Em execução	(1) (2)
1085/2013	Projeto básico e executivo de engenharia e execução de serviços técnicos de aplicação e manutenção e dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 52, na BR-407/BR-428 no Estado de Pernambuco.	04/02/14	X	X	Em execução	(1) (2)
1086/2013	Projeto básico e executivo de engenharia e execução de serviços técnicos de aplicação e manutenção e dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, Lote 53, na Rodovia Federal BR-101/BR-235 no Estado de Sergipe.	14/03/14			Encerrado	(1) (2)
825/2013	Elaboração dos projetos básicos e executivo e execução das obras de adequação de capacidade da Rodovia BR-381/MG (Norte), incluindo a duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e segurança de segmentos do trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP; subtrecho: entre BR-116/MG (Governador Valadares) e MG-020 (Av. Cristiano Machado/ Belo Horizonte); segmento: km 155,4 - km 458,4; Lote 01.	24/10/13	X		Rescindido	(1) (2) (4)
828/2013	Elaboração dos projetos básicos e executivo e execução das obras de adequação de capacidade da Rodovia BR-381/MG (Norte), incluindo a duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e segurança de segmentos do trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP; subtrecho: entre Acesso a Belo Oriente e MG-320 (para Jaguarçu); segmento: km 228,2 a km 288,4 - Lote 02.	24/10/13	X		Rescindido	(1) (2) (4)

Nº do contrato	Objeto	Data de assinatura	Adit. de prazo	Adit. de valor	Situação	Fonte de informação
814/2013	Elaboração dos projetos básicos e executivo e execução das obras de adequação de capacidade da Rodovia BR-381/NG (Norte), incluindo a duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e segurança de segmentos do trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP; subtrecho: entre MG-320 (para Jaguarapu) e Ribeirão Prainha; segmento: km 288,4 a km 317,0 - Lote 03.1.	23/10/13			Rescindido	(1) (2) (4)
815/2013	Elaboração dos projetos básicos e executivo e execução das obras de adequação de capacidade da rodovia BR-381/MG (Norte), incluindo a duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e segurança de segmentos - Lote 3.2.	23/10/13			Encerrado	(1) (2) (3) (4)
816/2013	Execução dos projetos básico e executivo e execução das obras de adequação de capacidade da Rodovia BR-381/MG (Norte), incluindo a duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e segurança de segmentos - Lote 3.3.	15/10/13			Encerrado	(1) (2) (3) (4)
895/2013	Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Adequação de Capacidade da Rodovia BR-381/MG (Norte), incluindo a Duplicação, Melhoramentos e Ampliação de Capacidade e Segurança de Segmentos; trecho Div. ES/MG - Div. MG/SP, subtrecho: entr. BR-116/MG (Governador Valadares) - entr. MG-020 (Av. Cristiano Machado / Belo Horizonte); segmento: km 155,4 - km 458,4. Lote 6.0.	23/10/13			Rescindido	(1) (2) (4)
817/2013	Elaboração dos projetos básicos e executivo e execução das obras de adequação de capacidade da Rodovia BR-381/NG (Norte), incluindo a duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e segurança de segmentos do trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP; subtrecho: entre Rio Una e MG-435 (Caeté); segmento: km 389,5 - km 427,0 - Lote 07.	23/10/13	X	X	Em execução	(1) (2) (4)
808/2014	Contrato de empreitada para elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras de duplicação, restauração com melhoramentos, implantação de vias laterais e obras de arte especiais na Rodovia BR-153; trecho divisa MG/SP - divisa SP/PR; trecho 1: km 54,3 ao km 59,52, trecho 2: km 59,52 ao km 64,20, trecho 3: km 64,20 ao km 72,1.	03/09/14	X	X	Em execução	(1) (2)
259/2014	Contratação de empresa para prestação de serviço técnico especializado de engenharia para elaboração do projeto básico, executivo e execução das obras de construção e pavimentação do perímetro urbano do município de Ventania/PR e implantação de vias marginais na rodovia BR-153/PR, trecho: entr. BR-369 (A) (divisa PR/SC), subtrecho: entr. PR-090 (Ventania) - entr. PR-340 (p/ Tibagi), segmento: km 163,738 ao km 164,338, extensão: 0,600 km.	09/04/14	X		Encerrado	(1) (2)
354/2014	Seleção de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras de construção da ponte sobre o Rio Tubarão (LE), incluindo demolição da ponte existente, no segmento compreendido entre os km 337,03 e 337,37.	22/05/14	X		Encerrado	(1) (2) (3)
723/2013	Elaboração de projeto básico e de projeto executivo de engenharia e execução das obras de restauração da pista existente, de adequação de capacidade, melhoria da segurança com eliminação de pontos críticos de contornos rodoviários, duplicação, implantação de sistemas de iluminação pública e construção de obras de arte especiais, na rodovia BR-163/364/MT.	18/09/13	X	X	Em execução	(1) (2)
913/2013	Elaboração do Projeto Básico e Executivo e execução das Obras para Adequação da passagem Urbana na Rodovia BR-163/PR com execução de Pavimentação de Ruas Marginais, Interseções em Desnível e Passarelas no Perímetro Urbano de Marechal Cândido Rondon/PR.	11/11/13	X		Encerrado	(1) (2) (3)
878/2013	Elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras de implantação e pavimentação com obras de arte especiais na rodovia BR-487/PR.	02/10/13	X		Encerrado	(1) (2) (3)
879/2013	Elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras de implantação e pavimentação com obras de arte especiais na rodovia BR-158/PR.	02/10/13			Suspenso	(1) (2)

Nº do contrato	Objeto	Data de assinatura	Adit. de prazo	Adit. de valor	Situação	Fonte de informação
1099/2013	Serviços de desenvolvimento dos projetos básicos e executivos e execução das obras e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final da ponte sobre o Rio Madeira em Abunã e de seus acessos na BR-364/RO.	12/12/13	X		Em execução	(1) (2)
101/2014	Elaboração dos Projetos Básicos e Executivo e Execução das Obras de implantação e pavimentação, incluindo os encabeçamentos das pontes, na Rodovia BR-242/TO - Lote 04.	17/02/14	X		Encerrado	(1) (2)
1090/2013	Contratada integrada de empresa para elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras de implantação e pavimentação, incluindo os encabeçamentos das Pontes, na rodovia BR-242/TO.	03/02/14	X		Em execução	(1) (2)
861/2013	Elaboração dos projetos básicos e executivo e execução das obras de recuperação estrutural das pontes de acesso, cais flutuantes de atracação das torres e do ROADWAY, bem como das obras de restauração, adequação e modernização da área retro portuária, além da requalificação do Porto de Manaus para a Copa do Mundo de 2014.	30/10/13			Rescindido	(1) (2)
1111/2013	Contratação integrada de empresa para elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras de duplicação, restauração com melhoramentos e obras de arte especiais, na rodovia BR-493/RJ.	31/12/13	X		Suspensão	(1) (2)
1089/2013	Prestação de serviços de elaboração de projeto básico e de projeto executivo de engenharia e execução das obras de restauração da pista existente, de adequação de capacidade, melhoria de segurança com eliminação de pontos críticos, duplicação e construção de obra de arte especiais na rodovia BR-163/364/MT - Lote 03.	10/02/14	X	X	Em execução	(1) (2)
1088/2013	Prestação de serviço técnico especializado de engenharia para elaboração de projeto básico e executivo e execução das obras de construção da nova aldeia indígena no município de estrela na BR-386/RS.	31/12/13	X	X	Encerrado	(1) (2)
316/2014	Elaboração dos projetos básicos e executivo e execução das obras de construção de uma segunda ponte sobre o Rio Guaíba e acessos, na Rodovia BR-116/290/RS.	28/03/14	X		Em execução	(1) (2)
733/2014	Contratação integrada de empresa para elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução das obras de construção das instalações portuárias públicas de pequeno porte IP-4, nos municípios de São Miguel do Guamá, Augusto Corrêa e Viseu.	13/08/14	X	X	Em execução	(1) (2)
734/2014	Contratação Integrada de empresa para Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Construção das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte IP-4, nos municípios de Abaetetuba e Cametá.	13/08/14	X	X	Em execução	(1) (2)
735/2014	Contratação Integrada de empresa para Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Construção das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte IP-4, nos municípios de Juruti e Oriximiná.	13/08/14	X		Em execução	(1) (2)
736/2014	Contratação Integrada de empresa para Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Construção da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte - IP4 no município de Belém (Mosqueiro)/PA.	21/08/14	X	X	Em execução	(1) (2)
629/2014	Contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de construção na Rodovia BR-135/BA; Trecho: Divisa PI/BA - Divisa BA/MG; subtrecho: COCOS - Div. BA/MG; Segmento: km 443,9 - km 466,8; Extensão: 22,9 km.	16/07/14	X		Suspensão	(1) (2)
748/2014	Contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de duplicação e restauração com melhoramentos, da rodovia BR-101/BA - Lote 01, incluindo obras de arte especiais, trecho: Div. SE/BA - Div. BA/ES, subtrecho: Div. SE/BA - entr. BA-093/400 (Entre Rios), segmento: km 0,00 - km 41,60, extensão 41,6 km.	15/09/14	X		Em execução	(1) (2)

Nº do contrato	Objeto	Data de assinatura	Adit. de prazo	Adit. de valor	Situação	Fonte de informação
749/2014	Contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de duplicação e restauração com melhoramentos, da rodovia BR-101/BA - Lote 02, incluindo obras de arte especiais, trecho: Div. SE/BA - Div. BA/ES, subtrecho: entr. BA-233 (Esplanada) - entr. BA-110 (A), segmento: km 41,60 a km 83,58, extensão: 41,98 km.	15/09/14	X		Em execução	(1) (2)
750/2014	Contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de duplicação e restauração com melhoramentos, da rodovia BR-101/BA - Lote 03, incluindo Obras de Arte Especiais, trecho: Div. SE/BA - Div. BA/ES, subtrecho: entr. BA-401 (Sítio do Meio) - entr. BA-515 (Teodoro Sampaio), segmento: km 83,58 a km 124,60, extensão: 41,02 km.	10/09/14	X		Suspensão	(1) (2)
751/2014	Contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de duplicação e restauração com melhoramentos, da rodovia BR-101/BA - Lote 04, incluindo Obras de Arte Especiais, trecho: Div. SE/BA - Div. BA/ES, subtrecho: entr. BA-503 - entr. BA-084 (Conceição do Jacuípe), segmento: km 124,60 a km 165,40, extensão: 40,8 km.	10/09/14	X		Suspensão	(1) (2)
858/2014	Elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de duplicação, implantação de vias laterais, adequação de capacidade, restauração com melhoramento e obras-de-arte especiais na rodovia BR-116. Trecho: Div. PE/BA (Ibó) - Div. BA/MG; subtrecho: entr. BR-235 - entr. BA-220 (Euclides da Cunha); Segmento: km 113,36 - km 211,83; Extensão: 98,47 km.	06/10/14	X		Em execução	(1) (2)
875/2014	Contratação integrada para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de duplicação, implantação de vias laterais, adequação de capacidade, restauração com melhoramentos e obras de arte especiais, na rodovia BR 116/BA. Trecho: Div. PE/BA (Ibó) Div. BA/MG; subtrecho: Div. PE/BA (Ibó)-entr. BR-235; Segmento: km 0,00 - km 113,36; Extensão: 113,36 km.	16/10/14	X		Suspensão	(1) (2)
876/2014	Contratação integrada de empresas para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de duplicação, implantação de vias laterais, restauração com melhoramentos e obras de arte especiais na rodovia BR-116/BA. Trecho: Div. PE/BA (Ibó) Div. BA/MG; subtrecho: BA-220 (Euclides da Cunha) -entr. BR-410/BA-395 (Tucano); Segmento: km 211,83 - km 274,23, Extensão: 62,40 km.	20/10/14	X		Em execução	(1) (2)
877/2014	Contratação integrada para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de duplicação, implantação de vias laterais, adequação de capacidade, restauração com melhoramentos e obras-de-arte especiais na rodovia BR-116/BA. trecho: Div. PE/BA (Ibó) - Div. BA/MG; subtrecho: entr. BR-410/BA-395 (Tucano) - entr. BR-349 (p/Teofilândia); Segmento: km 274,23-km 334,23; Extensão: 60 km.	20/10/14	X		Em execução	(1) (2)
878/2014	Contratação integrada para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de duplicação, implantação de vias laterais, adequação de capacidade, restauração com melhoramento e obras de arte especiais, na rodovia BR-116/BA; Trecho: Div. PE/BA (Ibó) - Div. BA/MG; subtrecho: entr. BR-349 (p/ Teofilândia) - Ent. BA-504 (p/ Santanópolis); Segmento: km 334,23 - km 387,41; Extensão: 53,18 km.	16/10/14	X		Suspensão	(1) (2)
836/2014	Execução dos serviços de elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras de adequação de capacidade da rodovia BR-163/PR, incluindo obras de arte especiais pelo regime de contratação integrada: rodovia BR: 163/PR, trecho: entr. BR-280 (A)/ 373 (A) (divisa SC/PR) - divisa PR/MS (Ponte s/ Rio Paraná - Guaíra), subtrecho: entr. PR-182 (Marmelândia) - entr. BR-277 (p/Cascavel), segmento: km 117,10 0 km 191,10, extensão: 74,0 km.	12/09/14	X		Em execução	(1) (2)

Nº do contrato	Objeto	Data de assinatura	Adit. de prazo	Adit. de valor	Situação	Fonte de informação
837/2014	Execução dos serviços de elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras de adequação de capacidade da rodovia BR-163/PR, incluindo obras de arte especiais, no trecho de Toledo a Marechal Cândido Rondon, trecho: entr. BR-280 (A)/ 373 (A) (div. SC/PR) - div. PR/MS (Ponte s/ Rio Paraná - Guaira), subtrecho: entr. PR-181/317/585 (Toledo) - entr. BR-467 (B) (p/ Marechal Cândido Rondon), segmento: km 235,5 a km 274,4, extensão: 38,90 km.	12/09/14	X		Em execução	(1) (2)
549/2014	Elaboração de Projeto Básico e de Projeto Executivo de Engenharia e Execução das Obras Remanescentes e Complementares de Adequação de Capacidade, Melhoramentos, Segurança de Tráfego, Eliminação de Pontos Críticos, Ampliação de Vias Marginais e Construção de Obras de Arte Especiais e Passarelas da BR-101/RN (km 95,9 ao km 109,1).	21/10/14	X		Em execução	(1) (2)
549/2014	Elaboração de Projeto Básico e de Projeto Executivo de Engenharia e Execução das Obras Remanescentes e Complementares de Adequação de Capacidade, Melhoramentos, Segurança de Tráfego, Eliminação de Pontos Críticos, Ampliação de Vias Marginais e Construção de Obras de Arte Especiais e Passarelas da BR-101/RN (km 95,9 ao km 109,1).	21/10/14	X		Em execução	(1) (2)
675/2014	Elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras de estabilização de taludes na rodovia BR-282/SC, no segmento do km 223+100 ao km 309+300.	01/09/14	X		Encerrado	(1) (2)
609/2014	Elaboração dos projetos básicos e executivo e execução das obras de adequação de capacidade da rodovia BR-381/MG (Norte), incluindo a duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e segurança de segmentos do trecho: div. ES/MG - div. MG/SP; subtrecho: entre Ribeirão Prainha e Acesso Sul de Nova Era; extensão: 18,8 km - Lote 1 - Lote de obras 4.	15/08/14			Rescindido	(1) (2)
610/2014	Elaboração dos projetos básicos e executivo e execução das obras de adequação de capacidade da rodovia BR-381/MG (Norte), incluindo a duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e segurança de segmentos do trecho: div. ES/MG - div. MG/SP; subtrecho: entre Acesso Sul de Nova Era e João Monlevade; extensão: 20,7 km - Lote 2 - Lote de obras 5.	15/08/14			Rescindido	(1) (2)
726/2014	Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para a elaboração do projeto básico e do projeto executivo e execução das obras de restauração, na rodovia BR-155/PA; trecho: entr. BR-158 (Redenção) - entr. BR-222 (Marabá); subtrecho: entr. PA-279 (Singulara) - entr. PA-275 (Eldorado dos Carajás); segmento: km 109,80 ao km 250,34; extensão: 144,30 km.	29/08/14	X		Em execução	(1) (2)
702/2014	Contratação integrada para elaboração do projeto básico e executivo de engenharia e realização das obras de implantação e pavimentação de ruas laterais com transposição da rodovia por obras de artes especiais, com melhoramentos para adequação de capacidade e segurança na rodovia BR-364/RO, Travessia Urbana Porto Velho.	30/07/14	X		Em execução	(1) (2)
802/2014	Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras remanescentes de implantação do Plano Rodoviário de Juiz de Fora (adequação da capacidade de tráfego), incluindo OAE's, na Rodovia BR-440/MG.	09/09/14	X		Em execução	(1) (2)
<b>Total</b>			<b>102</b>	<b>82</b>		

Elaborado por SINAENCO.

**Fonte de informações:**

- (1) Publicações do Diário Oficial da União até 29 de maio de 2019.
- (2) API de Compras Governamentais com aditamentos atualizados até março de 2018.
- (3) Relatórios de Gestão do DNIT.
- (4) Informações enviadas pelo DNIT por meio da Lei de Acesso à Informação.

Maio/2019

**sinaenco**  
SINDICATO DA ARQUITETURA E DA ENGENHARIA

Rua Marquês de Itu, 70, 3º andar  
01223-000 - São Paulo - SP - Brasil  
Tel.: 11 3123-9200  
Fax: 11 3120-3629  
[www.sinaenco.com.br](http://www.sinaenco.com.br)
